PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE OPERE PUBBLICHE
SERVIZIO OPERE CIVILI
UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

COMUNE DI TESERO

LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Lavori di adeguamento dello stadio del fondo a Lago di Tesero LIF3

FASE PROGETTO: PROGETTO ESECUTIVO

CATEGORIA: SICUREZZA

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

L.P.	C.SO.	S.SO.	FASE PROGETTO	TIPO LIV.	CATEGORIA	PROT.CORRIL.	N.PROGR.	REVISIONE
E-60/000	5364	- - -	E	T	420	LIF3	005	

PROGETTISTA(RTI/STP/SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI/CONSORZIO STABILE/CONSORZIO ARTIGIANO/ DI COOP.ED/CONP.PROD.)/PERSO.FISICA/PERSO.GIURIDICA	PROGETTISTA INTEGRATO/TECNICO	TIMB. TL DIRIGENTE
Ing. Giordano FARINA	Ing. Renato COSER	Ing. Marco GELMINI
RELAZIONE GEOLOGICA	PIANO DELLE SEMPLIF.	TIMB. TL DIRETTORE DELL'UFFICIO
geol. Mirko DEMOZZI	geom. Sebastian GILMOZZI	arch. Silvano TOMASELLI
		IL COORDINATORE DEL GRUPPO DI PROGETTO: Ing. Gabriele DEVIGILI
CSP	ESECUZ.COORD.NEL/DI ANN.PERTE	RELAZIONE ACUSTICA
Ing. Fabio GANZ	Ing. Matteo GIULIANI	tec. Lorenzo TOMASELLI
		RELAZIONE FORESTALE
		dott. Enrico TONEZZER
ADMI TEC		DATA REDAZIONE MARZO 2024

LE DATE ESPOSTE SONO PURAMENTE INDICATIVE E NON VINCOLANTI
LE DATE DI SOSPENSIONE SONO PURAMENTE INDICATIVE E NON VINCOLANTI

DURATA DEL CANTIERE: GIORNI LAVORATIVI 221
PERIODO DI SOSPENSIONE: DAL 07/12/2024 AL 03/02/2025
SONO COMPRESI I FERMI CANTIERE DOVUTI
AL METEO SFAVOREVOLE E LE FERIE CONTRATTUALI
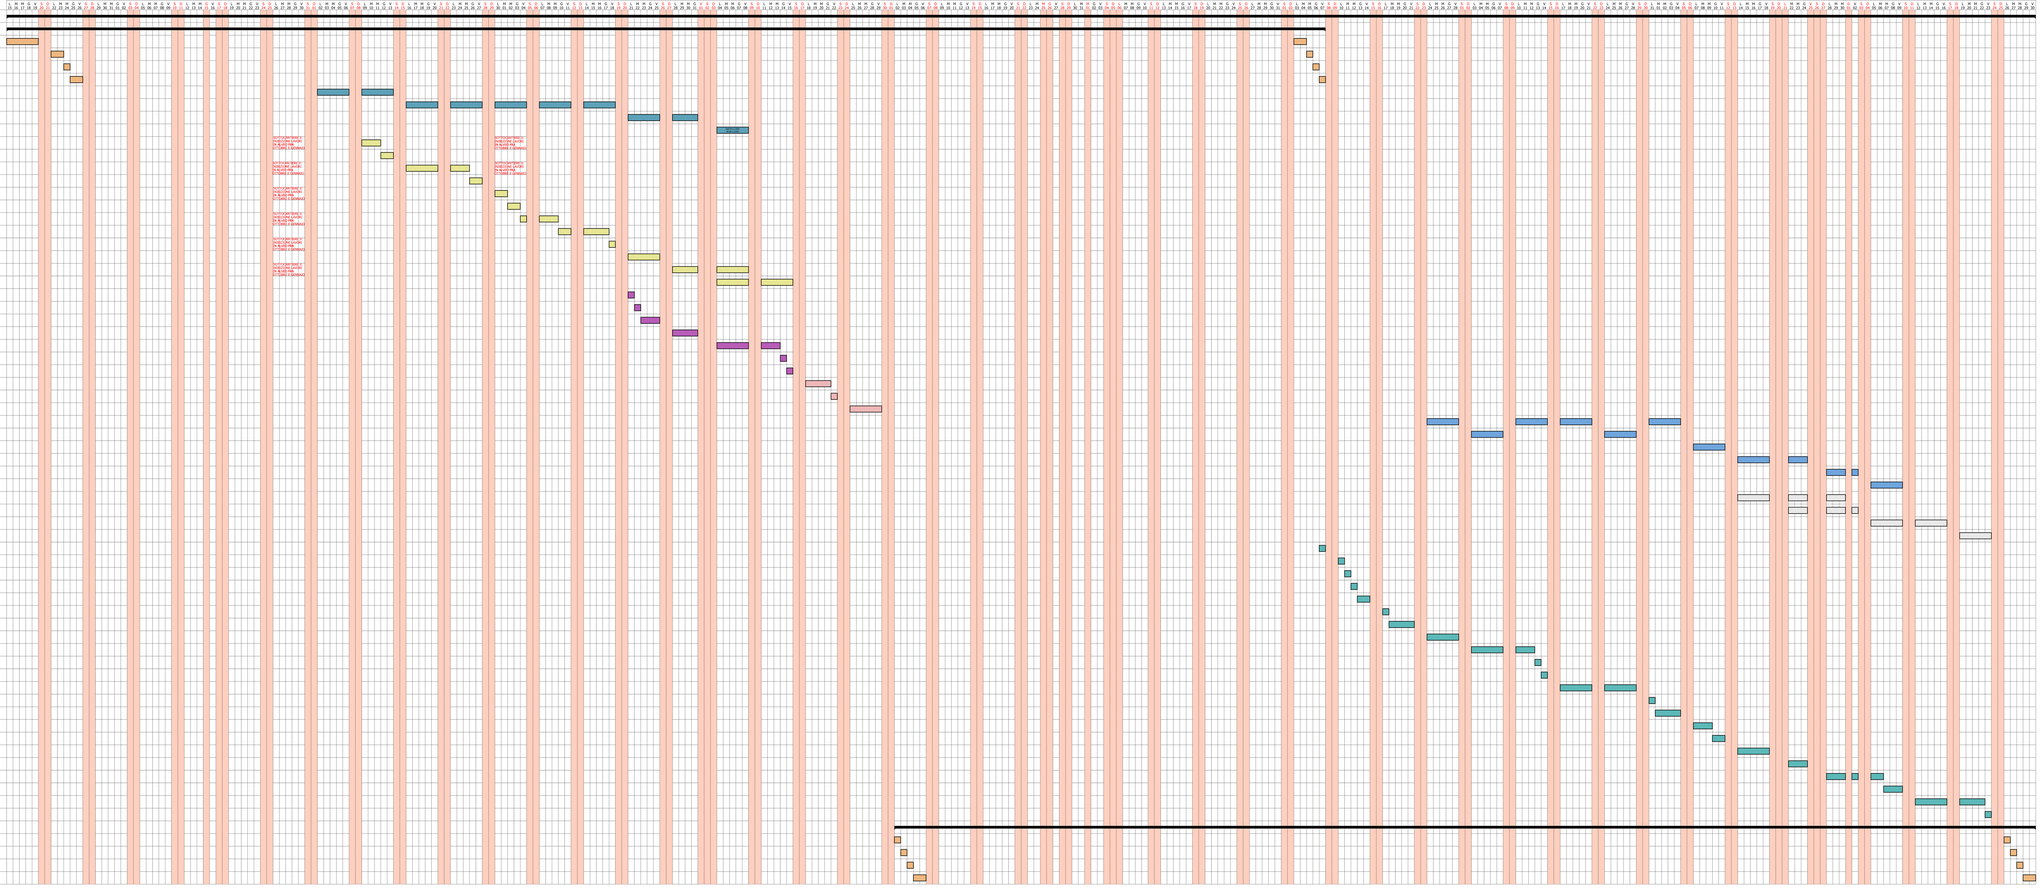
Nome Fase/Descrizione	Durata	Inizio	Fine	Area	Impresa esecutrice
Diagramma di Gantt	221/320	15/07/2024	30/05/2025		
Allestimento cantiere	144/208	15/07/2024	07/02/2025		
Delimitazione dell'area di cantiere	7/7	15/07/2024	04/02/2025	Intero cantiere	Impresa esecutrice (opere in categoria OG6
Locale spogliatoio	3/3	22/07/2024	05/02/2025	Intero cantiere	Impresa esecutrice (opere in categoria OG6
Servizi igienici di cantiere	2/2	24/07/2024	06/02/2025	Intero cantiere	Impresa esecutrice (opere in categoria OG6
Impianto elettrico alimentato da gruppo elettrogeno	3/3	25/07/2024	07/02/2025	Intero cantiere	Impresa esecutrice (opere in categoria OG6
CANTIERE 1 - NUOVE PISTE Taglio piante e arbigianche rimanenti	19/19	02/09/2024	12/09/2024	SOTTOCANTIERE 1	Impresa esecutrice (opere in categoria OG3
CANTIERE 1 - NUOVE PISTE Scavi di sbancamento e macchina	25/25	16/09/2024	28/10/2024	SOTTOCANTIERE 1	Impresa esecutrice (opere in categoria OG3
CANTIERE 1 - NUOVE PISTE Ripulto terreno e fondazione	9/9	21/10/2024	31/10/2024	SOTTOCANTIERE 1	Impresa esecutrice (opere in categoria OG3
CANTIERE 1 - NUOVE PISTE Semina e stabilizzati	5/5	04/11/2024	08/11/2024	SOTTOCANTIERE 1	Impresa esecutrice (opere in categoria OG3
CANTIERE 2 - OPERA DI PRESA Scavi ampli con mezzo	3/3	09/09/2024	11/09/2024	SOTTOCANTIERE 2	eventuale subappalto (categoria OG1 -
CANTIERE 2 - OPERA DI PRESA Demolizione di strutture in ca.	2/2	12/09/2024	13/09/2024	SOTTOCANTIERE 2	eventuale subappalto (categoria OG1 -
CANTIERE 2 - OPERA DI PRESA Posa tubi ed opere prefabbricate	8/8	16/09/2024	25/09/2024	SOTTOCANTIERE 2	eventuale subappalto (categoria OG1 -
CANTIERE 2 - OPERA DI PRESA Realizzazione scogliera	2/2	26/09/2024	27/09/2024	SOTTOCANTIERE 2	eventuale subappalto (categoria OG1 -
CANTIERE 2 - OPERA DI PRESA Scavo a posa pozzetti	2/2	30/09/2024	01/10/2024	SOTTOCANTIERE 2	eventuale subappalto (categoria OG1 -
CANTIERE 2 - OPERA DI PRESA Scavi di sbancamento e	2/2	02/10/2024	03/10/2024	SOTTOCANTIERE 2	eventuale subappalto (categoria OG1 -
CANTIERE 2 - OPERA DI PRESA Fondazione e paleria in ca. armato	4/4	04/10/2024	09/10/2024	SOTTOCANTIERE 2	eventuale subappalto (categoria OG1 -
CANTIERE 2 - OPERA DI PRESA Pareti contro terra in ca. armato	6/6	10/10/2024	17/10/2024	SOTTOCANTIERE 2	eventuale subappalto (categoria OG1 -
CANTIERE 2 - OPERA DI PRESA Posa in opera di elementi metallici	1/1	18/10/2024	18/10/2024	SOTTOCANTIERE 2	eventuale subappalto (categoria OG1 -
CANTIERE 2 - OPERA DI PRESA Solaio in cemento armato a soletta piena	5/5	21/10/2024	25/10/2024	SOTTOCANTIERE 2	eventuale subappalto (categoria OG1 -
CANTIERE 2 - OPERA DI PRESA Posa tubazioni idrauliche	9/9	28/10/2024	08/11/2024	SOTTOCANTIERE 2	eventuale subappalto (categoria OG1 -
CANTIERE 2 - OPERA DI PRESA Installazione apparecchiature elettriche	10/10	04/11/2024	15/11/2024	SOTTOCANTIERE 2	eventuale subappalto (categoria OG1 -
CANTIERE 4 - ALLARGAMENTO PONTE Tagli strutturali La	1/1	21/10/2024	21/10/2024	SOTTOCANTIERE 4	eventuale subappalto (categoria OG1 -
CANTIERE 4 - ALLARGAMENTO PONTE Scavi di sbancamento e macchina	1/1	22/10/2024	22/10/2024	SOTTOCANTIERE 4	eventuale subappalto (categoria OG1 -
CANTIERE 4 - ALLARGAMENTO PONTE Fondazioni e paleria in ca. armato	3/3	23/10/2024	25/10/2024	SOTTOCANTIERE 4	eventuale subappalto (categoria OG1 -
CANTIERE 4 - ALLARGAMENTO PONTE Pareti contro terra in ca. armato	4/4	28/10/2024	31/10/2024	SOTTOCANTIERE 4	eventuale subappalto (categoria OG1 -
CANTIERE 4 - ALLARGAMENTO PONTE Solaio in cemento armato a soletta piena	8/8	04/11/2024	13/11/2024	SOTTOCANTIERE 4	eventuale subappalto (categoria OG1 -
CANTIERE 4 - ALLARGAMENTO PONTE Impermeabilizzazione pareti controterra	1/1	14/11/2024	14/11/2024	SOTTOCANTIERE 4	eventuale subappalto (categoria OG1 -
CANTIERE 4 - ALLARGAMENTO PONTE Impermeabilizzazione con guaina Bituminosa	1/1	15/11/2024	15/11/2024	SOTTOCANTIERE 4	eventuale subappalto (categoria OG1 -
CANTIERE 5 - RIO DEL MATON Scavi di sbancamento e	4/4	18/11/2024	21/11/2024	SOTTOCANTIERE 5	eventuale subappalto (categoria OG1 -
CANTIERE 5 - RIO DEL MATON Posa tubi ed opere prefabbricate	1/1	22/11/2024	22/11/2024	SOTTOCANTIERE 5	eventuale subappalto (categoria OG1 -
CANTIERE 5 - RIO DEL MATON Realizzazione scogliera e selciatura	5/5	25/11/2024	29/11/2024	SOTTOCANTIERE 5	eventuale subappalto (categoria OG1 -
CANTIERE 6 - INNEVAMENTO Posa tubi in ghisa	20/20	24/02/2025	04/04/2025	SOTTOCANTIERE 6	Impresa esecutrice (opere in categoria OG6
CANTIERE 6 - INNEVAMENTO Posa di tubazione per linea aria	10/10	03/03/2025	28/03/2025	SOTTOCANTIERE 6	Impresa esecutrice (opere in categoria OG6
CANTIERE 6 - INNEVAMENTO scavo e posa pozzetti	5/5	07/04/2025	11/04/2025	SOTTOCANTIERE 6	Impresa esecutrice (opere in categoria OG6
CANTIERE 6 - INNEVAMENTO Posa cavi entro tubazioni predisposte	8/8	14/04/2025	24/04/2025	SOTTOCANTIERE 6	Impresa esecutrice (opere in categoria OG6
CANTIERE 6 - INNEVAMENTO Demolizione di strutture in	4/4	28/04/2025	02/05/2025	SOTTOCANTIERE 6	Impresa esecutrice (opere in categoria OG6
CANTIERE 6 - INNEVAMENTO Posa GENERATORI DI NEVE	5/5	05/05/2025	09/05/2025	SOTTOCANTIERE 6	Impresa esecutrice (opere in categoria OG6
CANTIERE 7 - ILLUMINAZIONE E FIBRA Impianto elettrico e di terra	1/11	14/04/2025	30/04/2025	SOTTOCANTIERE 7	eventuale subappalto (categoria OG10 -
CANTIERE 7 - ILLUMINAZIONE E FIBRA Scavi a sezione ristretta	5/7	22/04/2025	02/05/2025	SOTTOCANTIERE 7	eventuale subappalto (categoria OG10 -
CANTIERE 7 - ILLUMINAZIONE E FIBRA Posa di tubazione per fibra ottica	10/10	05/05/2025	16/05/2025	SOTTOCANTIERE 7	eventuale subappalto (categoria OG10 -
CANTIERE 7 - ILLUMINAZIONE E FIBRA Posa cavi entro tubazioni predisposte	5/5	19/05/2025	23/05/2025	SOTTOCANTIERE 7	eventuale subappalto (categoria OG10 -
CANTIERE 2 - SALA POMPE Scarificazione di ineddittato stradale	1/1	07/01/2025	07/01/2025	SOTTOCANTIERE 2	eventuale subappalto (categoria OG1 -
CANTIERE 2 - SALA POMPE Tagli strutturali La	1/1	10/01/2025	10/01/2025	SOTTOCANTIERE 2	eventuale subappalto (categoria OG1 -
CANTIERE 2 - SALA POMPE Rimozione torri di raffreddamento	1/1	11/01/2025	11/01/2025	SOTTOCANTIERE 2	eventuale subappalto (categoria OG1 -
CANTIERE 2 - SALA POMPE Demolizione di strutture in c. a.	1/1	12/01/2025	12/01/2025	SOTTOCANTIERE 2	eventuale subappalto (categoria OG1 -
CANTIERE 2 - SALA POMPE Scavi di sbancamento e	2/2	13/01/2025	14/01/2025	SOTTOCANTIERE 2	eventuale subappalto (categoria OG1 -
CANTIERE 2 - SALA POMPE Bonifica e rimozione di amianto	1/1	17/01/2025	17/01/2025	SOTTOCANTIERE 2	eventuale subappalto (categoria OG1 -
CANTIERE 2 - SALA POMPE Sottomurazioni	4/4	18/02/2025	21/02/2025	SOTTOCANTIERE 2	eventuale subappalto (categoria OG1 -
CANTIERE 2 - SALA POMPE Fondazioni e paleria in ca. armato	5/5	24/02/2025	28/02/2025	SOTTOCANTIERE 2	eventuale subappalto (categoria OG1 -
CANTIERE 2 - SALA POMPE Pareti contro terra in ca.	8/8	03/03/2025	12/03/2025	SOTTOCANTIERE 2	eventuale subappalto (categoria OG1 -
CANTIERE 2 - SALA POMPE Impermeabilizzazione pareti controterra	1/1	13/03/2025	13/03/2025	SOTTOCANTIERE 2	eventuale subappalto (categoria OG1 -
CANTIERE 2 - SALA POMPE Rinterro di scavo con mezzo meccanico	1/1	14/03/2025	14/03/2025	SOTTOCANTIERE 2	eventuale subappalto (categoria OG1 -
CANTIERE 2 - SALA POMPE Solaio in cemento armato a soletta piena	10/10	17/03/2025	28/03/2025	SOTTOCANTIERE 2	eventuale subappalto (categoria OG1 -
CANTIERE 2 - SALA POMPE Impermeabilizzazione con guaina Bitumitoxa	1/1	31/03/2025	31/03/2025	SOTTOCANTIERE 2	eventuale subappalto (categoria OG1 -
CANTIERE 2 - SALA POMPE Posa in opera di elementi metallici	4/4	01/04/2025	04/04/2025	SOTTOCANTIERE 2	eventuale subappalto (categoria OG1 -
CANTIERE 2 - SALA POMPE Muratura in mattoni	3/3	07/04/2025	09/04/2025	SOTTOCANTIERE 2	eventuale subappalto (categoria OG1 -
CANTIERE 2 - SALA POMPE Montaggio infissi esterni in metallo	2/2	10/04/2025	11/04/2025	SOTTOCANTIERE 2	eventuale subappalto (categoria OG6
CANTIERE 2 - SALA POMPE Barriere antitrumere	5/5	14/04/2025	18/04/2025	SOTTOCANTIERE 2	eventuale subappalto (categoria OG6
CANTIERE 2 - SALA POMPE Impermeabilizzazione vasche con guaina bitumitoxa	3/3	22/04/2025	24/04/2025	SOTTOCANTIERE 2	eventuale subappalto (categoria OG1 -
CANTIERE 2 - SALA POMPE Posa tubazioni idrauliche	6/6	28/04/2025	06/05/2025	SOTTOCANTIERE 2	eventuale subappalto (categoria OG1 -
CANTIERE 2 - SALA POMPE Torri di raffreddamento	3/3	07/05/2025	09/05/2025	SOTTOCANTIERE 2	eventuale subappalto (categoria OG6
CANTIERE 2 - SALA POMPE Installazione apparecchiature elettriche	9/9	12/05/2025	22/05/2025	SOTTOCANTIERE 2	eventuale subappalto (categoria OG1 -
CANTIERE 2 - SALA POMPE Completamento bitumitoxa	1/1	23/05/2025	23/05/2025	SOTTOCANTIERE 2	eventuale subappalto (categoria OG1 -
Smobilizzo cantiere	113/180	02/12/2024	30/05/2025		
Locale spogliatoio	2/2	02/12/2024	26/05/2025	Intero cantiere	Impresa esecutrice (opere in categoria OG6
Servizi igienici di cantiere	2/2	03/12/2024	27/05/2025	Intero cantiere	Impresa esecutrice (opere in categoria OG6
Impianto elettrico alimentato da gruppo elettrogeno	2/2	04/12/2024	28/05/2025	Intero cantiere	Impresa esecutrice (opere in categoria OG6
Delimitazione dell'area di cantiere	4/4	05/12/2024	30/05/2025	Intero cantiere	Impresa esecutrice (opere in categoria OG6
